

智能印章与合同审查平台建设项目合同

1.1 合同主体

甲方：海岳数智运营有限公司

统一社会信用代码：91310000MAY202605

注册地址：上海市浦东新区星桥路 188 号

乙方：星瀚智印科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MAZH202626

注册地址：上海市闵行区云启路 66 号

双方就“海岳集团智能印章与合同审查平台建设项目”签署本合同。双方确认，本合同正文、项目 SOW、报价明细表、验收方案及经双方确认的补充文件共同构成本项目交付依据。

1.2 项目名称

本项目名称为：海岳集团智能印章与合同审查平台建设项目。

乙方应围绕甲方总部及区域分公司的用印管理、合同归档、合同智能问答、基础合同审查和统计分析需求，完成平台建设、设备交付、接口集成、数据初始化、培训上线和首年运维服务。

1.3 合同金额

本合同总价为人民币 1,280,000.00 元，价格已包含软件授权、硬件设备、实施部署、培训、首年维保和项目管理费用。大写金额：人民币壹佰贰拾万元整。

乙方应根据甲方付款节点开具合法有效的增值税专用发票。若发票信息、合同主体、付款账户或金额信息不一致，甲方有权暂停付款并要求乙方更正。

1.4 项目范围

本项目覆盖甲方总部及 3 个区域分公司，首批接入 80 枚实体印章、20 个合同审查账号、5 个审批系统接口和 1 套合同知识库问答服务。

乙方应交付以下能力：

- 智能印章设备与设备接入服务。
- 用印申请、审批、留痕、归档流程。
- 合同台账与履约节点管理。
- 合同知识库问答能力。
- 基础合同审查能力。
- 审批系统、统一身份认证和消息通知接口。
- 统计看板和审计日志。

1.5 交付期限

乙方应自合同生效之日起 45 个自然日内完成全部设备交付、平台部署、接口联调、数据初始化、用户培训和上线支持。

如甲方未及时提供网络环境、审批系统接口、印章清单、历史合同样本或测试账号，交付期限相应顺延。乙方应至少提前 3 个工作日以书面形式说明延期原因、影响范围和调整计划。

1.6 付款方式

第一期：合同签订且乙方开具合规发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%。

第二期：乙方完成系统部署、接口联调并通过甲方初步验收后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%。

第三期：项目终验通过、培训材料和运维资料移交完成后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%。

付款账户以乙方加盖公章的书面账户信息为准。

1.7 验收条款

乙方完成部署后，应向甲方提交上线申请、部署清单、接口联调记录、培训签到表、操作手册和验收申请。

甲方代表在验收单上签字或通过邮件确认后，视为项目验收通过。

如甲方在收到验收申请后 7 个工作日内未提出书面异议，视为验收通过。

1.8 违约责任

乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的 0.5% 向甲方支付违约金，违约金累计最高不超过合同总价的 20%。

乙方交付成果经两次整改仍不能满足甲方上线要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收款项。

甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的 0.02% 向乙方支付违约金。

1.9 保密与数据使用

双方对因本合同获得的业务资料、系统账号、合同文本、审批流程、客户资料、印章台账和技术方案负有保密义务。

未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息，但法律法规或监管机构要求披露的除外。

乙方不得将甲方提供的合同文本、审批记录、印章台账或业务数据用于其他客户演示、模型训练、公开宣传或非本项目目的的测试。

本条款在合同终止后继续有效。

1.10 争议解决

因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应先友好协商。协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

本合同未明确约定合同签订地。双方可在争议发生后另行协商确定。

1.11 附件

附件一：《报价明细表及交付清单》为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

附件二：《服务等级协议》为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

附件三：《第三方接口清单》为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

附件与正文不一致的，除附件中明确注明优先适用外，以本合同正文为准。

2. 项目背景与建设目标

2.1 项目背景

甲方目前在总部和区域公司分别管理实体印章、合同审批、用印留痕和合同归档。历史合同分散在文件服务器、业务系统和人工台账中，存在检索困难、用印记录不完整、合同履行节点跟踪不及时等问题。

甲方希望通过本项目建设统一的智能印章与合同审查平台，将用印、合同、档案和 AI 能力纳入同一业务闭环。

2.2 建设目标

本项目的建设目标包括：

1. 建立统一的印章设备接入和用印留痕机制。
2. 建立合同台账和履约节点跟踪能力。
3. 建立合同知识库问答能力，支持合同原文检索和引用。
4. 建立基础合同审查能力，支持金额、主体、付款、验收、附件等规则检查。
5. 建立面向管理层的统计看板和审计追踪能力。
6. 支持私有化部署，保障合同数据不出甲方指定环境。

2.3 组织覆盖范围

组织	覆盖范围	首批账号	首批印章	备注
总部	法务、财务、采购、销售、行政	80	32	重点上线合同审查
华东区域	销售、交付、行政	35	18	重点上线用印留痕
华南区域	销售、采购、行政	28	16	重点上线台账管理
西南区域	销售、售后、行政	20	14	重点上线履约提醒

3. 系统功能范围

3.1 功能总览

项目应交付以下主要系统模块：

模块	主要用途	关键输出
智能印章管理	管理实体印章、设备状态、用印申请、审批和留痕	用印记录、设备日志、审批状态
合同台账管理	管理合同基本信息、金额、相对方、履约节点	合同台账、节点提醒、履约状态
AI 知识库问答	对合同、SOW、制度、附件进行检索问答	带引用的问答结果
合同基础审查	对主体、金额、付款、验收、附件等做规则检查	风险项、证据、建议
审批集成接口	对接 OA、统一身份认证、消息通知等系统	接口日志、同步状态
统计看板	展示合同、用印、履约、风险数据	报表、趋势、异常提示

3.2 AI 知识库问答范围

AI 知识库问答应支持合同正文、项目 SOW、验收材料、操作手册、制度文件和报价附件的入库检索。

回答结果应尽量提供来源引用，包括章节名称、表格名称、附件名称或原文片段。对缺少依据的问题，系统应提示“未在资料中找到明确依据”，不得编造答案。

3.3 合同基础审查范围

合同基础审查应至少覆盖以下规则：

- 合同主体是否前后一致。
- 合同金额、小写金额、大写金额、报价表合计是否一致。
- 付款节点是否与交付、验收、发票条件绑定。
- 交付期限、上线期限、服务期限是否前后一致。
- 验收标准是否明确。
- 违约责任是否明显不对等。
- 附件是否完整。
- 数据安全条款是否与部署方式一致。
- 需要人工复核的条款是否被标记。

3.4 人工复核原则

AI 审查结果仅作为辅助判断。涉及高金额、法律解释、主体异常、金额冲突、低置信度 OCR、扫描件模糊、附件缺失和多处条款冲突的事项，应进入人工复核。

业务流程图中设置了人工复核节点，但合同正文未明确人工复核的责任部门、处理时限和复核结论的效力。

4. 项目实施 SOW

4.1 实施阶段

SOW 将项目分为五个阶段：

阶段	计划周期	主要工作	阶段输出
启动与调研	第 1-5 天	项目启动、组织访谈、系统现状确认	调研纪要、项目计划
环境准备	第 6-12 天	服务器、网络、账号、接口权限准备	环境检查表
部署与配置	第 13-30 天	平台部署、设备接入、参数配置	部署清单、配置表
接口联调	第 31-45 天	OA、SSO、消息、合同台账接口联调	接口联调记录
试运行与上线	第 46-60 天	用户培训、试运行、问题整改、上线	培训材料、上线报告

4.2 SOW 上线周期

SOW 中约定，乙方应在项目启动后 60 个自然日内完成部署、接口联调、用户培训和上线支持。

如因甲方网络、安全、接口权限或审批流程导致延迟，乙方应提交延期说明。

4.3 项目团队

角色	人数	主要职责
项目经理	1	计划管理、沟通协调、风险跟踪
后端工程师	2	接口、台账、审批集成、服务端部署
前端工程师	1	管理端页面、问答界面、审查结果页面
AI 应用工程师	1	知识库入库、RAG 检索、合同审查提示词与规则
实施顾问	2	设备接入、培训、上线支持
测试工程师	1	功能测试、验收测试、问题回归

4.4 里程碑记录

- 第 15 天应完成基础环境部署。
 - 第 30 天应完成核心模块配置。
 - 第 45 天应完成接口联调。
 - 第 60 天应完成试运行总结和上线报告。
- 项目会议纪要中曾写明：“若核心审批接口无法在第 45 天前完成联调，则项目上线时间顺延至第 60 天后另行确认。”

5. 交付物与验收材料

5.1 交付物清单

编号	交付物	格式	交付阶段	是否验收必需
D-01	智能印章管理平台	系统	部署与配置	是
D-02	合同台账管理模块	系统	部署与配置	是
D-03	AI 知识库问答模块	系统	试运行	是
D-04	合同基础审查模块	系统	试运行	是
D-05	审批集成接口	接口	接口联调	是
D-06	设备接入清单	Excel	部署与配置	是
D-07	接口说明书	Word/PDF	接口联调	是
D-08	用户操作手册	Word/PDF	试运行	是
D-09	培训签到表	Excel/PDF	培训	是
D-10	上线报告	Word/PDF	上线	是
D-11	运维交接清单	Excel	上线	是

5.2 验收材料

项目验收材料包括部署清单、接口联调记录、测试记录、问题整改清单、培训签到表、操作手册、上线报告和运维交接清单。

如果 AI 知识库问答模块上线，应额外提供至少 30 条测试问题及回答记录，记录中应包含问题、答案、引用来源和人工确认结果。

5.3 交付物与付款关系

付款节点	触发条件	关联交付物	备注
第一期 30%	合同签订并开具发票	项目计划	不依赖验收
第二期 40%	初步验收通过	D-01 至 D-07	合同正文约定
第三期 30%	终验通过并完成材料移交	D-08 至 D-11	合同正文约定

SOW 中另有说明：如果接口联调记录缺失，但系统主体功能可演示，项目经理可申请进入试运行。

5.4 验收材料缺失处理

若验收材料缺失，甲方可要求乙方在 5 个工作日内补齐。若缺失材料影响核心功能确认，甲方有权暂缓对应付款节点。

若缺失材料仅影响后续运维交接，不影响初步验收，则双方可在验收单中列明遗留事项，并约定整改期限。

6. 报价明细表

6.1 报价总览

报价表中的价格均为含税价格，税率为 6%。报价表合计金额为人民币 1,260,000.00 元。

6.2 报价明细

序号	类别	产品/		数量	单位	单价 (元)	税率	含税金 额 (元)	交付 地点/ 备注
		服务 名称	型号 规格						
1	硬件 设备	智能 印章 柜	XWJ- CAB- 24	4	台	58,000	6%	232,000	总部 2 台、 区域 2 台
2	硬件 设备	便携 式智 能印 章盒	XWJ- BOX-M	20	台	9,800	6%	196,000	区域 分公 司
3	硬件 设备	高清 用印 摄像 头	CAM- 1080P	40	个	1,200	6%	48,000	含支 架
4	硬件 设备	设备 安装 辅材	STD- KIT	1	批	36,000	6%	36,000	含线 材和 固定 件

序号	类别	产品/服务		数量	单位	单价 (元)	税率	含税金 额 (元)	交付 地点/ 备注
		名称	型号 规格						
5	软件 授权	印章 管控 平台 授权	ZKJ- BASE	1	套	220,000	6%	220,000	首年 授权
6	软件 授权	合同 台账 模块	ZKJ- CONTR ACT	1	套	90,000	6%	90,000	含基 础字 段配 置
7	软件 授权	AI 知 识库 问答 模块	ZKJ- KB	1	套	120,000	6%	120,000	不含 第三 方模 型费 用
8	软件 授权	基础 合同 审查 模块	ZKJ- REVIE W	1	套	150,000	6%	150,000	含 20 个审 查账 号

6.3 报价明细（续表）

序号	类别	产品/ 服务 名称	型号 规格	数量	单位	单价 (元)	税率	含税金 额 (元)	交付 地点/ 备注
9	实施 服务	系统 部署 与参 数配 置	IMPL- SETUP	1	项	65,000	6%	65,000	总部 环境
10	实施 服务	审批 系统 接口 联调	IMPL- API	5	个	16,000	6%	80,000	OA、 SSO、 消息 等
11	实施 服务	历史 合同 数据 导入	IMPL- DATA	1	项	45,000	6%	45,000	不含 纸质 扫描
12	实施 服务	上线 培训	IMPL- TRAIN	6	场	8,000	6%	48,000	管理 员 2 场， 用户 4 场
13	维保 服务	首年 维保 与远 程支	MAINT -Y1	1	年	30,000	6%	30,000	自上 线日 起算

序号	类别	产品/		数量	单位	单价 (元)	税率	含税金	交付
		名称	型号 规格					额	地点/
		持						(元)	备注
14	维保	季度	MAINT	4	次	6,000	6%	24,000	远程
	服务	巡检	-Q						巡检
15	项目	项目	PM	1	项	36,000	6%	36,000	含周
	管理	经理							报和
		与交							会议
		付协							
		调							
16	项目	验收	PM-	1	项	20,000	6%	20,000	终验
	管理	资料	ACC						前移
		整理							交
合计								1,260,000	

6.4 报价表商务说明

本报价表约定：设备到货并完成清点后 10 个工作日内支付合同总价 40%；试运行 30 日后支付合同总价 30%。

报价表备注：AI 知识库问答模块不含第三方云模型调用费用，如甲方要求使用云端模型或云端 OCR 服务，费用另行结算。

7. 验收方案与付款关联

7.1 初步验收

初步验收应覆盖以下内容：

- 平台可登录。
- 印章设备可接入。
- 用印申请、审批、留痕流程可运行。
- 合同台账可新增、查询、导出。
- 至少 10 份合同可完成知识库入库和问答。
- 合同基础审查模块可输出风险项、证据和建议。
- OA、SSO、消息通知接口至少完成测试环境联调。

7.2 终验

终验应覆盖以下内容：

- 首批组织上线。
- 培训完成并留存签到记录。
- 历史合同导入完成。
- 运维交接清单完成。
- 试运行问题完成整改或形成遗留事项清单。

7.3 验收问题处理

验收中发现的问题按严重程度分为 A、B、C 三类。

等级	定义	处理要求
A 类	影响核心流程，导致无法上线	必须整改后再验收
B 类	影响部分功能，但可通过临时方案绕行	可列入遗留事项，约定整改时间
C 类	展示、文案、体验或低频配置问题	不影响验收，可后续优化

验收方案中未明确各类问题的数量阈值。例如，若存在 3 个 B 类问题和 8 个 C 类问题，是否可以通过终验，需双方另行确认。

7.4 验收确认方式

甲方项目经理邮件确认、业务负责人签署验收单、或双方会议纪要均可作为验收确认材料。

如果三类确认材料结论不一致，应以双方盖章验收单为准。

8. 运维服务与响应机制

8.1 维保范围

乙方提供自项目上线之日起 12 个月的免费维保服务。维保范围包括：

- 系统缺陷修复。
- 远程技术支持。
- 基础配置调整。
- 季度巡检。
- 管理员复训 1 次。
- 知识库索引重建支持 2 次。

8.2 响应时间

问题等级	定义	响应时间	处理目标
P1	系统整体不可用， 影响大范围用印	4 小时	24 小时内恢复或 提供绕行方案
P2	核心模块部分不可 用	8 小时	2 个工作日内处理
P3	单个用户、单条数 据或低频问题	2 个工作日	5 个工作日内处理
P4	咨询、配置、文案 类问题	3 个工作日	排入常规优化

8.3 运维边界

以下事项不包含在免费维保范围内：

- 新增业务模块。
- 新增大型接口。
- 大规模历史纸质合同扫描。
- 第三方云模型调用费用。
- 甲方网络、服务器、数据库、中间件故障导致的问题。

如甲方需要增加合同智能审查规则库、批量 OCR、跨系统数据治理或专属模型部署，双方应另行确认工作量和费用。

8.4 知识库维护

知识库维护包括文档入库、索引重建、低质量文档标记、Bad Case 收集和问答效果复盘。

乙方建议每月抽取不少于 50 条问答记录进行质量复盘，检查答案准确性、引用完整性、拒答合理性和幻觉风险。

9. 数据安全与私有化部署

9.1 部署方式

本项目原则上采用私有化部署。合同文本、审批记录、印章台账、用印影像和知识库索引应保存在甲方指定服务器或甲方授权的专有环境中。

乙方不得未经甲方书面确认，将合同原文、扫描件、印章影像或审批记录传输至非甲方指定环境。

9.2 模型与 OCR

SOW 中建议优先使用甲方本地部署的大模型、Embedding 模型和 OCR 服务。

如本地模型无法满足复杂表格识别、图片理解或长文本推理需求，乙方可临时调用第三方云 OCR 或云端大模型 API 完成识别与审查，但应在调用前向甲方项目经理邮件报备。

该临时调用方案未说明数据脱敏方式、保存周期、调用日志和审批权限。

9.3 权限和日志

系统应支持基于角色的权限控制。至少包括管理员、法务、财务、业务经办人、审计人员和只读访客角色。

系统应记录以下日志：

- 用户登录日志。
- 合同查看和下载日志。
- 用印申请和审批日志。
- AI 问答日志。
- 合同审查日志。
- 风险项人工复核日志。
- 管理员配置变更日志。


9.4 数据留存

项目实施期间生成的临时文件、中间解析文本、OCR 结果、向量索引和问答日志应纳入数据留存策略。

SOW 中未明确中间解析文本和向量索引是否在项目结束后删除或长期保存。

10. 业务流程图与系统架构图

10.1 合同审查业务流程

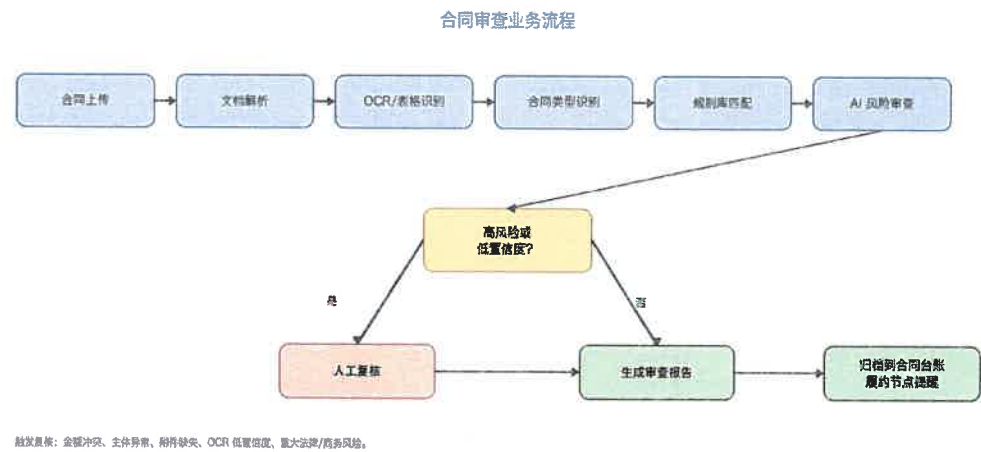


合同审查业务流程图

流程说明：高风险、低置信度、金额冲突、主体异常、附件缺失、OCR 质量不足等情况应进入人工复核。

正文合同未明确人工复核责任部门和复核处理时限。


10.2 知识库问答处理流程

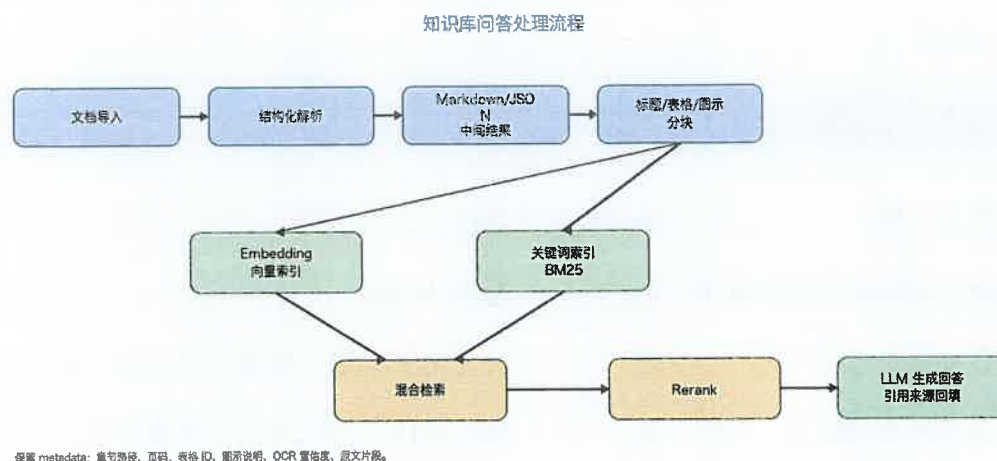

知识库问答处理流程图

流程说明：表格、流程图、附件和签署页应保留独立来源信息。对于扫描件，应保留 OCR 置信度和人工复核标记。

10.3 系统架构图

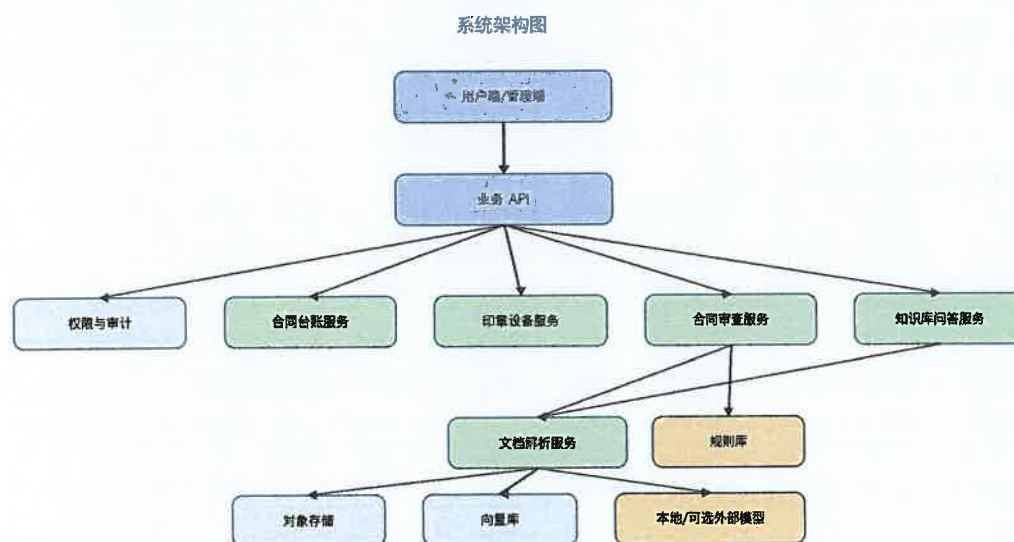

系统架构图

11. 附件说明与签署页

11.1 附件清单

本文档实际提供以下附件内容：

附件编号	附件名称	是否提供	备注
附件一	报价明细表及交付清单	是	见第 6 章
附件二	服务等级协议	否	合同正文引用，但本文档未提供完整内容
附件三	第三方接口清单	否	SOW 引用，但本文档未提供完整内容

11.2 签署页

甲方：海岳数智运营有限公司

授权代表：林知远

日期：2026 年 5 月 18 日

乙方：星瀚智印技术有限公司

授权代表：周明川

日期：2026 年 5 月 18 日

签署页乙方名称以盖章信息为准。

12. 项目过程记录节选

12.1 第一次项目会议纪要

会议日期：2026 年 5 月 21 日

参会方：甲方项目组、乙方项目经理、乙方实施顾问

会议结论：

1. 甲方希望优先上线印章设备接入、合同台账和用印审批闭环。
2. AI 知识库问答模块可先使用 50 份历史合同进行试运行。
3. 合同基础审查模块先覆盖金额、主体、付款、验收、附件五类规则。
4. 第三方云 OCR 暂不作为默认方案，除非扫描件识别效果不满足要求。

12.2 第二次项目会议纪要

会议日期：2026 年 5 月 28 日

会议结论：

1. 乙方建议先完成 20 份合同的知识库入库测试。
2. 甲方要求所有合同问答必须带原文引用。
3. 甲方要求合同审查报告必须支持人工确认和驳回。
4. 双方尚未确认人工复核结果是否影响付款节点。

12.3 数据样本说明

甲方计划提供以下样本文档：

类型	数量	格式	备注
销售合同	20	Word/PDF	多数为原生文本
采购合同	15	Word/PDF	部分含报价附件
服务协议	10	PDF	部分为扫描件
项目 SOW	5	Word	含流程图和表格
制度文件	8	Word/PDF	用于规则依据

如果样本文档包含图片、扫描页或跨页表格，乙方应在解析报告中标记识别质量。

12.4 知识库测试问题样例

甲方建议试运行阶段至少测试以下问题：

- 1. 某合同的服务期限是什么？
- 2. 某合同付款节点有哪些？
- 3. 哪些合同包含质保条款？
- 4. 某项目交付物有哪些？
- 5. 合同中是否提到违约责任上限？

12.5 合同审查测试规则样例

甲方建议先上线以下基础规则：

规则编号	规则名称	规则说明
CR-001	主体一致性	检查正文、附件、签署页主体是否一致
CR-002	金额一致性	检查小写金额、大写金额、附件合计金额
CR-003	付款条件	检查付款是否绑定交付、验收、发票
CR-004	验收标准	检查验收是否有明确标准和材料
CR-005	附件完整性	检查正文引用附件是否实际提供
CR-006	人工复核	检查高风险或低置信度事项是否有复核机制

12.6 风险复盘机制

系统上线后，每周应复盘上一周的 AI 审查结果。复盘内容包括风险命中率、人工确认率、误报率、漏报案例、低置信度原因和规则优化建议。

若某类风险连续两周被人工驳回，乙方应调整规则或模型提示词，并在复盘记录中说明调整依据。

13. 长文档补充段落：项目执行细节

13.1 调研阶段细节

调研阶段需要确认甲方组织架构、印章种类、审批流程、合同分类、历史台账格式、数据权限和现有系统接口。

调研输出应包括《调研纪要》《需求确认表》《风险清单》和《项目计划》。如调研结论与合同范围不一致，应通过变更流程确认。

13.2 环境阶段细节

环境准备阶段需要确认服务器资源、操作系统版本、数据库版本、对象存储、网络策略、域名证书和账号权限。

如甲方安全策略不允许访问外部模型 API，乙方应调整为本地模型或离线处理方案。

13.3 部署阶段细节

部署阶段包括基础服务安装、数据库初始化、对象存储配置、向量库配置、模型服务配置、业务参数配置和管理员账号创建。

部署清单应记录服务器地址、服务名称、端口、部署时间、版本号、负责人和回滚方案。

13.4 设备接入细节

设备接入应包含智能印章柜、便携式印章盒、摄像头和相关辅材。每台设备应绑定组织、保管人、设备编号和启用状态。

如果设备离线，应在管理端显示离线状态，并保留最近一次心跳时间。

13.5 接口联调细节

接口联调应覆盖统一身份认证、组织用户同步、审批状态回写、消息通知和合同台账同步。

接口联调记录应包含接口名称、请求方式、字段映射、测试时间、测试结果、失败原因和整改状态。

13.6 合同台账细节

合同台账字段至少包括合同编号、合同名称、合同类型、相对方、金额、签署日期、生效日期、到期日期、付款节点、履约节点和附件状态。

合同台账应支持按组织、相对方、金额区间、合同类型、履约状态和风险等级筛选。

13.7 AI 知识库细节

知识库入库流程应包括文件上传、格式识别、文本解析、图片提取、表格识别、Markdown 生成、分块、向量化和索引写入。

系统应保留原始文件、解析后的 Markdown、chunk metadata、向量索引 ID 和问题回答日志。

13.8 合同审查细节

合同审查流程应包括合同类型识别、规则库匹配、事实抽取、规则判断、模型补充判断、证据回溯、风险合并和人工复核。

风险输出应包含风险等级、风险类型、原文证据、判断理由、修改建议、置信度和复核状态。

13.9 培训细节

培训对象包括系统管理员、法务用户、财务用户、业务经办人和审计人员。

培训材料应包含操作手册、常见问题、流程图、账号权限说明和风险复核说明。

13.10 上线细节

上线前应完成基础功能测试、接口联调测试、权限测试、数据导入测试、知识库问答测试和合同审查测试。

上线报告应记录上线范围、版本号、未解决问题、责任人、计划完成时间和应急联系人。

13.11 运维交接细节

运维交接应包含服务清单、账号清单、接口清单、日志路径、备份策略、告警方式、应急预案和常见问题。

如果使用本地模型，运维交接还应包含模型版本、部署路径、推理服务端口、显存占用、日志路径和重启方式。

13.12 数据归档细节

项目交付后，所有合同原文、解析文件、审查报告、问答记录、人工复核记录和验收材料应归档。

归档目录应按项目、文档类型、日期和版本组织，避免后续无法追溯。

13.13 问答质量复盘

问答质量复盘应至少覆盖准确性、引用完整性、拒答合理性、多轮上下文保持能力和响应时延。

如果回答引用了错误章节，应记录为引用错误；如果回答正确但没有引用，应记录为引用缺失。

13.14 审查质量复盘

审查质量复盘应至少覆盖风险命中、误报、漏报、重复风险、证据缺失、建议不可执行和人工复核通过率。

对于高风险漏报，应优先分析解析是否失败、规则是否缺失、检索是否遗漏或模型判断是否错误。

13.15 扩展规则库

未来规则库可按销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同、工程合同和招投标文件进行分类。

销售合同可进一步按产品类型、客户类型、合同金额和交付方式加载不同规则。采购合同可进一步按供应商类型、付款比例和验收方式加载不同规则。

13.16 多模型组合

系统可使用小模型完成分类、字段抽取和意图识别，使用大模型完成复杂条款解释、跨段冲突判断和审查报告生成。

如果模型输出与规则结果冲突，应优先保留规则命中和原文证据，并将模型判断作为补充说明。

13.17 扫描件处理

对于扫描件，应记录 OCR 置信度、页码、版面区域、表格识别结果和图片说明。

对于低置信度区域，应标记人工复核，不应直接作为金额、主体或付款节点的唯一依据。

13.18 跨页表格处理

跨页表格应识别续表关系，恢复表头、列名、行号和合计行。

如果表格第二页缺少表头，系统应根据前一页表格结构进行推断，但推断结果应保留置信度。

13.19 图示处理

流程图和架构图应转换为可检索文本说明，至少保留节点、连线、判断条件和输出结果。

如果流程图中存在人工复核节点，合同正文或 SOW 应明确复核责任和时限；若未明确，应进入审查结果。

13.20 结论性说明

本项目文档同时包含合同约定、SOW、报价表、流程图、验收说明、运维条款和数据安全要求。任何单一章节都不足以完整判断项目风险。

系统应先构建全局事实表，再做分段审查和跨段一致性检查。对于金额、主体、付款、验收、附件和数据安全相关问题，应优先保留原文证据并进入人工复核。

14. 附录 A：甲方合同与用印制度节选

14.1 合同金额一致性要求

甲方合同管理制度要求，合同正文金额、附件报价金额、审批系统金额、发票金额和付款申请金额应保持一致。

如合同正文金额与附件报价金额不一致，应在签署前由经办部门、财务部门和法务部门共同确认，并在合同中明确金额优先级。

金额不一致但未说明优先级的合同，不得直接进入付款流程。

14.2 大小写金额要求

合同正文中同时出现小写金额和大写金额时，应保证二者完全一致。

若大小写金额不一致，系统应提示经办人复核，并以双方盖章确认的最终版本为准。

14.3 付款节点要求

甲方制度要求，付款节点原则上应绑定可验证事件，例如合同签署、设备到货、部署完成、初步验收、终验通过、发票接收或资料移交。

对于信息化项目，不建议仅以“邮件确认”“默认无异议”作为大额付款触发条件。

若付款节点依赖验收，应明确验收材料、验收负责人、验收时限、整改机制和付款顺延规则。

14.4 验收材料要求

信息化项目验收材料通常包括：

- 部署清单。
- 接口联调记录。
- 功能测试记录。
- 问题整改清单。
- 培训签到表。
- 操作手册。
- 上线报告。
- 运维交接清单。

缺少核心验收材料时，不应直接触发后续付款。

15. 附录 B：合同审查指引节选

15.1 主体一致性

合同主体应在合同首页、正文、附件、授权委托书、签署页、付款账户信息中保持一致。

如果主体名称存在简称、错字、历史名称、品牌名称或关联公司名称，应要求经办部门补充说明。

对于主体不一致但仍需签署的合同，应提供授权文件或主体变更说明。

15.2 附件完整性

合同正文引用的附件应随合同一并归档。

如正文写明“附件为本合同组成部分”，但附件未提供，应提示经办人补齐附件，或删除相关引用并重新确认条款。

若附件与正文冲突，应明确优先适用顺序。

15.3 违约责任审查

违约责任应关注责任触发条件、赔偿范围、违约金计算方式、责任上限和双方责任是否明显失衡。

如果乙方逾期交付责任较重，而甲方逾期付款责任较轻，应提示业务部门确认是否符合谈判预期。

违约金比例过高或过低时，应标记为人工复核。

15.4 争议解决审查

争议解决条款应明确法院或仲裁机构。

如果条款仅写“合同签订地人民法院管辖”，但合同没有写明签订地，应提示补充具体地点。

跨区域履约合同还应关注管辖地是否便于执行。

16. 附录 C：用印与合同归档流程节选

16.1 用印申请

用印申请应关联合同编号、合同名称、相对方、用印份数、用印类型、审批流程和附件文件。

经办人提交用印申请时，应上传拟用印合同文本。系统应记录文本版本号和上传时间。

16.2 用印审批

用印审批通常经过业务负责人、财务负责人、法务负责人和印章管理员。

如合同涉及高风险条款、金额异常、主体异常或附件缺失，系统应提示审批人重点关注。

16.3 用印留痕

用印留痕应记录印章编号、用印时间、用印人、审批单号、合同编号、影像文件和设备日志。

如果设备离线或影像缺失，应进入异常流程。

16.4 合同归档

用印完成后的合同应归档到合同台账，并关联审批记录、用印记录、扫描件、附件和履约节点。

归档后的合同可进入知识库，但入库前应完成敏感信息处理和权限校验。

17. 附录 D：历史合同导入批次清单

17.1 导入批次总览

批次	文档类型	数量	格式	质量情况	处理建议
B-01	销售合同	120	DOCX/PDF	多数为原生文本	可直接解析
B-02	采购合同	85	DOCX/PDF	多数含报价附件	表格需单独处理
B-03	服务协议	60	PDF	部分为扫描件	需要 OCR
B-04	项目 SOW	40	DOCX	含流程图和表格	图示需转文本
B-05	历史用印记录	300	Excel	字段不统一	需要字段映射
B-06	制度文件	25	Word/PDF	版本较多	需要去重和版本标记

17.2 字段映射要求

历史合同导入时，应将合同编号、合同名称、相对方、金额、签署日期、到期日期、付款节点、履约节点和附件状态映射到统一字段。

如果源文件缺少字段，应标记为空值，不应由模型随意补全。

17.3 导入质量检查

导入完成后应至少检查以下内容：

- 合同数量是否与源文件数量一致。
- 合同金额合计是否与原始台账一致。
- 相对方名称是否存在明显重复或错别字。
- 附件是否成功关联。
- 扫描件是否有 OCR 结果。
- 图片和表格是否保留来源信息。

17.4 问题样例

历史合同样本中存在以下常见问题：

问题类型	示例	处理方式
主体简称	“星瀚智印”与“星瀚智印 科技有限公司”混用	建立别名表
金额格式混乱	“128 万”“1,280,000”“壹佰 贰拾捌万元”混用	标准化金额字段
附件缺失	正文引用报价单但文件夹无 附件	标记缺失
扫描质量差	印章页倾斜、阴影、低分辨 率	OCR 后人工复核

18. 附录 E：邮件与沟通记录节选

18.1 关于云端 OCR 的邮件

发件人：乙方项目经理

收件人：甲方项目经理

日期：2026 年 5 月 29 日

邮件内容：

考虑到部分历史合同为低分辨率扫描件，乙方建议在试运行阶段临时调用第三方云 OCR 服务，以提高表格识别准确率。调用前可先对合同主体、金额和联系人信息做脱敏处理。请甲方确认是否允许。

甲方回复：

原则上不允许合同原文离开甲方环境。如确需测试，请先提供脱敏方案、调用清单、数据保存周期和删除证明模板。

18.2 关于付款条件的邮件

发件人：甲方财务负责人

收件人：甲方项目经理、乙方项目经理

日期：2026 年 6 月 2 日

邮件内容：

报价表中写到货后支付 40%，但合同正文写初步验收后支付 40%。请确认后续付款申请按哪个条件执行。财务侧建议以合同正文为准，但需在附件或补充说明中同步修订。

18.3 关于验收标准的会议纪要

会议日期：2026 年 6 月 5 日

会议记录：

1. 甲方业务部门认为只要核心流程可演示即可初验。
2. 甲方法务部门要求补充验收标准和问题整改清单。
3. 乙方认为验收标准可在上线报告中统一补充。
4. 双方未在会议中确认 B 类问题数量是否影响终验。

18.4 关于人工复核的沟通记录

沟通记录显示，甲方希望所有高风险合同审查结果进入人工复核，但暂未确定复核人角色。

候选角色包括法务负责人、合同经办人、财务负责人和业务部门负责人。

系统流程图中存在人工复核节点，但合同正文和 SOW 均未明确复核时限。

19. 附录 F：变更记录与未决事项

19.1 变更记录

变更编号	变更事项	提出方	状态	影响
CHG-001	增加 AI 知识库 问答模块	甲方	已纳入范围	增加文档入库和 问答验收
CHG-002	增加基础合同审 查模块	甲方	已纳入范围	增加规则库和审 查报告
CHG-003	使用第三方云 OCR 测试扫描件	乙方	待确认	涉及数据安全
CHG-004	将上线周期从 45 天调整到 60 天	乙方	待确认	影响交付和付款
CHG-005	补充附件二服务 等级协议	双方	未完成	影响附件完整性

19.2 未决事项

截至当前文档版本，以下事项仍未最终确认：

- 第三方云 OCR 是否允许调用。
- 附件二《服务等级协议》是否补齐。
- 附件三《第三方接口清单》是否补齐。
- 人工复核责任人和处理时限。
- 45 天交付与 60 天上线之间的优先级。
- 付款节点以合同正文还是报价表商务说明为准。

19.3 风险登记表

风险编号	风险描述	当前状态	建议处理
P-RISK-01	审批接口联调延期	跟踪中	明确接口负责人和测试窗口
P-RISK-02	历史扫描件 OCR 质量不稳定	跟踪中	抽样测试并设置人工复核
P-RISK-03	附件服务等级协议缺失	未解决	补齐附件或删除引用
P-RISK-04	验收标准不够具体	未解决	补充验收指标和问题等级阈值
P-RISK-05	付款条件前后不一致	未解决	统一合同正文和报价表

19.4 最终备注

本文档用于测试候选人对复杂企业文档的处理能力。文档中的问题并非全部集中在同一章节，而是分散在合同正文、SOW、报价表、验收方案、制度节选、邮件记录、流程图和签署页中。

候选人应通过合理的解析、分块、检索、事实抽取和审查逻辑，将分散信息组织成可复核的结果。

